

Planejamento Estratégico e Revisão da Estrutura

Nome do Professor: Camila Neves e Renata Vilhena
Nome da Disciplina: Monitoramento estratégico out/25



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria-Geral do Estado




FDC GESTÃO
PÚBLICA

Projeto Acordo Legal

Gestor: Rafael Santos de Almeida

Situação das atividades

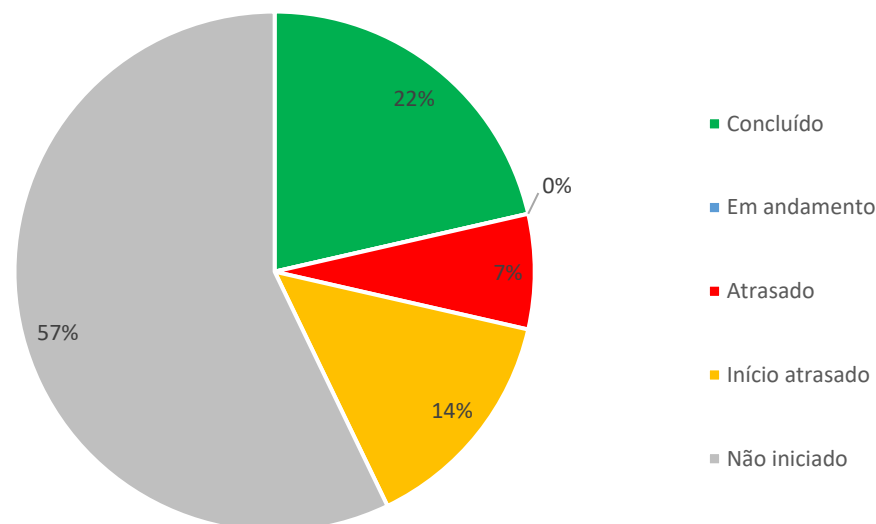


DESTAQUES

- Na tarefa “Obter com as setoriais da PGE temas recorrentes para elaboração da planilha”, apenas PCJ e PEP retornaram com sugestões de temas recorrentes. – Necessário validar se esses retornos são suficientes. Importante registrar que as demais tarefas do projeto estão seguindo com os insumos encaminhados.
- Tarefas em Risco:
 - (1) Validar a versão definitiva da planilha para início do trabalho de análise dos processos e preenchimento das informações coletadas.
 - (2) Iniciar a análise dos processos e o preenchimento da planilha. – previstas para iniciar em outubro porém, por restrição de servidores (férias/licença).

Projeto PGE Ágil

Gestora: Maira Campanha Souto Gama

Situação das atividades

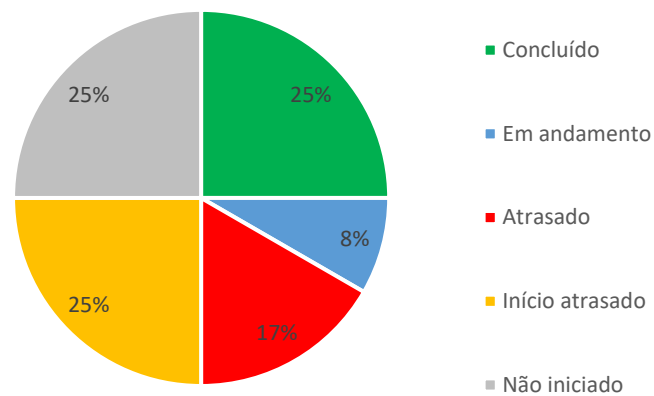


DESTAQUES

ID	Problema/Necessidade Identificada	Ação Corretiva Proposta (O que fazer?)	Responsável (Quem)	Prazo	Situação	Recursos Necessários (Como/Quanto?)
PA-201	Consolidação da planilha de monitoramento PPE e SPGA	Fazer as proposições para melhoria	Rômulo	20/10/2025	Em andamento	Equipe
PA-202	Proposta de regulamentação de fluxos internos para utilização dos pareceres e orientações jurídicas padronizadas.	Realização de reunião para alinhar entrega da atividade 1.2.3: (Proposta de regulamentação de fluxos internos para utilização dos pareceres e orientações jurídicas padronizadas).	Dr. Pérciles	30/10/2025	Não iniciado	

Projeto Recupera +

Gestor: Eliezer Lins Sant Anna

Situação das atividades

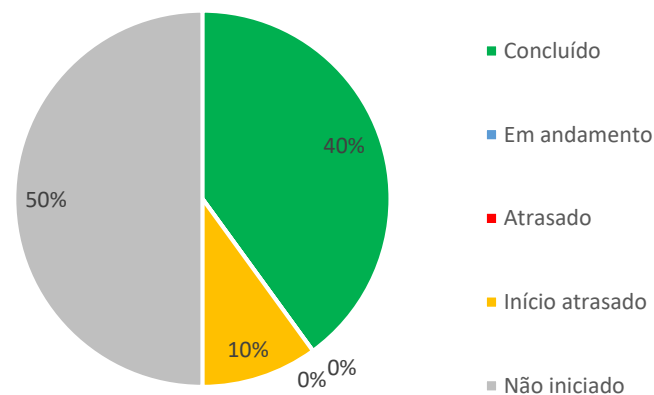


DESTAQUES:

Falta atualizar riscos das tarefas com o gestor

Projeto Execução ótima

Gestor: Aline Hardman Dantas

Situação das atividades

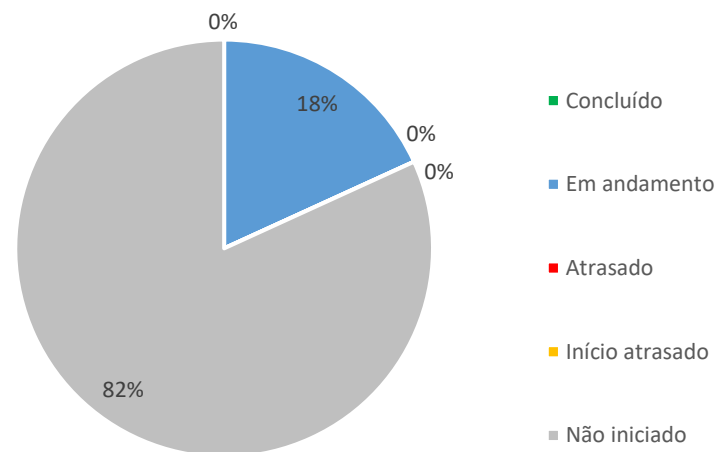


DESTAQUES

Levantamento dos casos passíveis de soluções autocompositivas e análise de impacto financeiro	Equipe do Projeto	90	01/10/2025	29/12/2025		-	Sim	Em andamento	Análise de impacto para precatórios finalizado Análise de impacto para RPV em andamento
Definição de critérios e parâmetros para priorização de soluções	Equipe do Projeto	60	01/11/2025	29/12/2025		1.1.1	Não	Não iniciado	Será agendada reunião interna PEP para início da definição dos critérios e parâmetros, até 31/10/2025
Mapeamento dos entraves normativos e institucionais	Equipe do Projeto	90	01/10/2025	29/12/2025		-	Sim	Em andamento	

Projeto Concilia PGE

Gestor: Rafael Santos de Almeida

Situação das atividades

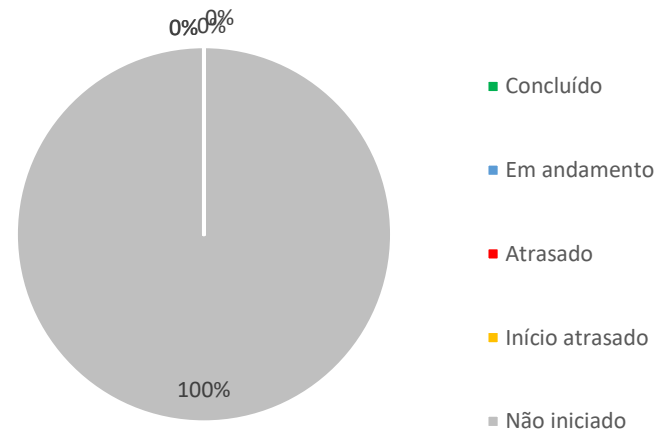


DESTAQUES

- Todos as tarefas tem seu inicio previsto para 2026

Projeto Radar PGE

Gestor: Paulo Sérgio de Souza

Situação das atividades

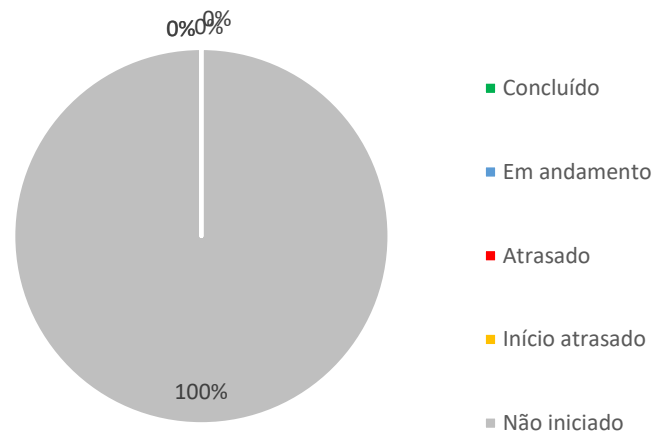


DESTAQUES

- Todos as tarefas tem seu início previsto para 2026

Projeto Monitor Estratégico

Gestor: Lívio Oliveira Ramalho

Situação das atividades

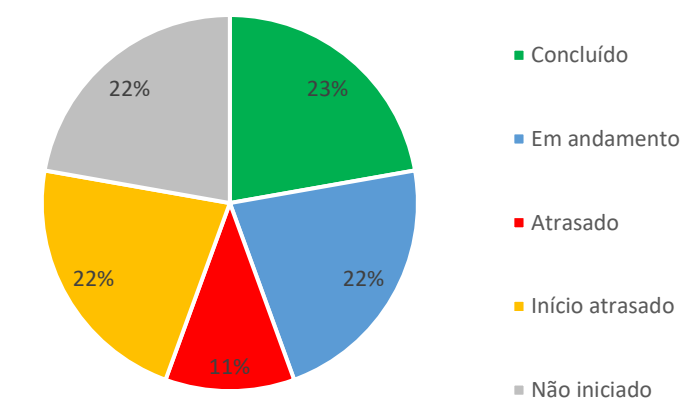

DESTAQUES:


- Necessário reavaliar cronograma. (Potencial desalinhamento entre cronograma do projeto e o de implementação da solução tecnológica (SAJ INSIGHTS))

ID	Problema/Necessidade Identificada	Ação Corretiva Proposta (O que fazer?)	Responsável (Quem)	Prazo	Situação
PA-901	Alinhar atividades com o projeto Monitor Estratégico	Reunião com o Dr. Livio para alinhar com o projeto "par"	Dra. Maira	24/10/2025	Em andamento

Projeto Monitor Estratégico Administrativo

Gestor: Maira Campana Souto Gama

Situação das atividades

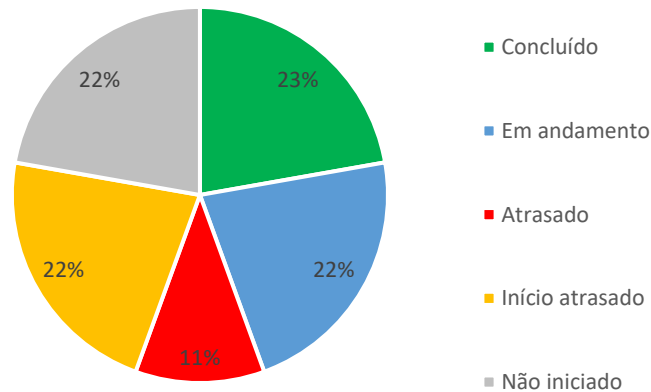

DESTAQUES:


- Necessário reavaliar cronograma. (Potencial desalinhamento entre cronograma do projeto e o de implementação da solução tecnológica (SAJ INSIGHTS))

ID	Problema/Necessidade Identificada	Ação Corretiva Proposta (O que fazer?)	Responsável (Quem)	Prazo	Situação	Recursos Necessários (Como/Quanto?)
PA-901	Alinhar atividades com o projeto Monitor Estratégico	Reunião com o Dr. Livio para alinhar com o projeto "par"	Dra. Maira	24/10/2025	Em andamento	

Projeto Revisão PMD

Gestor: Luciana Merçon Vieira

Situação das atividades

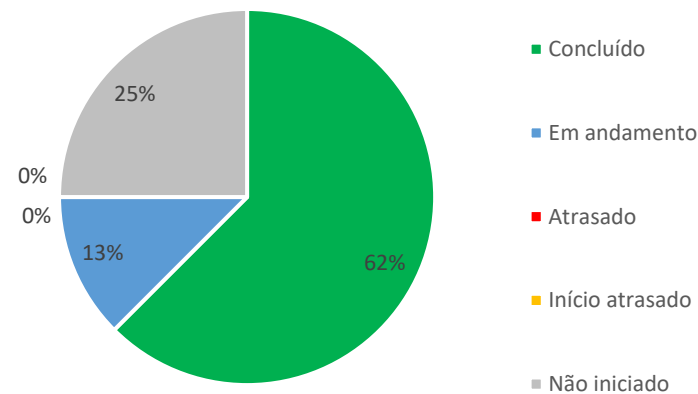

DESTAQUES


- Todas as tarefas estão em dia.

Revisão PMD	1.4.1	Reunião para apresentação e homologação das novas metas	LUCIANA E ROGER	30	10/10/2025	10/11/2025		Ata assinada contendo: homologação das metas	Sim	Em andamento	Novas metas debatidas e consolidadas e até dia 17/10/2025 será realizada a definição
-------------	-------	---	-----------------	----	------------	------------	--	--	-----	--------------	--

Projeto Uniformiza PGE

Gestor: Maira Campana Souto Gama

Situação das atividades

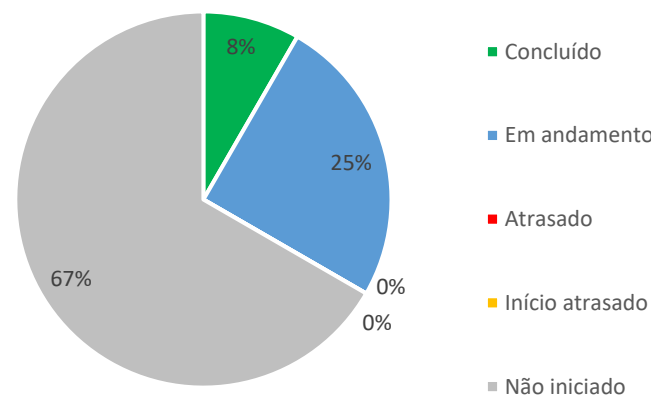


DESTAQUES: Sem destaques.

Definição de equipes responsáveis pelo desenvolvimento dos modelos	Líderes do Projeto	15	01/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	-	Sim	Concluído
Levantamento das peças jurídicas, pareceres e documentos oficiais que atendam aspectos jurídicos para padronização	Equipe do Projeto	30	17/10/2025	16/11/2025		1.1.1	Sim	Em andamento
Elaboração de minuta de portaria para regulamentação do uso de modelos	Equipe do Projeto	45	16/10/2025	30/11/2025		1.1.1	Não	Em andamento
Definição de critérios e formatos dos modelos padronizados	Equipe do Projeto	45	16/10/2025	30/11/2025		1.1.1	Sim	Em andamento

Projeto ComunicaAÇÃO

Gestor: Renato Heitor Santoro

Situação das atividades

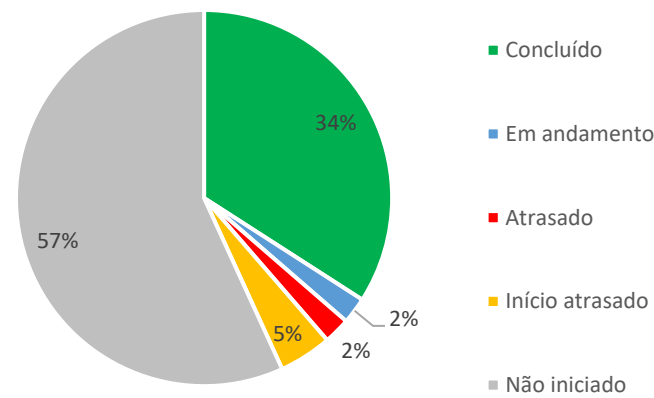


DESTAQUES

ID	Problema/Necessidade Identificada	Ação Corretiva Proposta (O que fazer?)	Responsável (Quem)	Prazo	Situação	Recursos Necessários (Como/Quanto?)
PA-1201	Pendencia de editoração do documento	Editorar	Renato ou Savita	07/11/2025	Em andamento	Equipe interna

Projeto Saber ES

Gestor: Rodrigo Francisco de Paula e Jasson Hibner Amaral

Situação das atividades

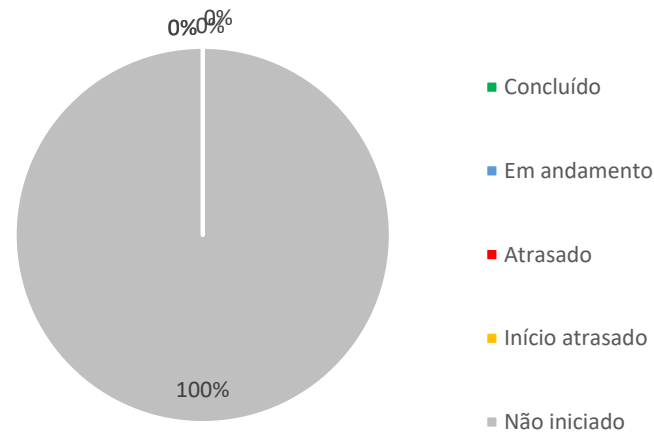


DESTAQUES

- Sem destaque. Início de tarefas previsto para 02/2026

Projeto PGE BemViver

Gestora: Eliza Martins Silva

Situação das atividades

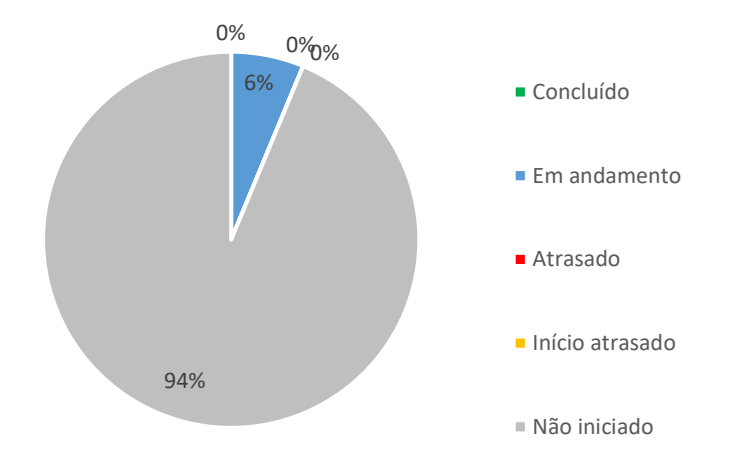

DESTAQUES


- Em relação a Tarefa: “Consulta aos servidores”, foi identificada a necessidade de verificar com a gestora qual o tipo de consulta será realizada junto aos servidores, para avaliar o risco de tal consulta ocorrer em período de fim de ano e férias escolares. Possível risco de engajamento em função do período.

PGE Bem Viver	1.1.2	Consulta aos servidores	Eliza M. Silva/GARH	60	01/12/2025	31/01/2026		1.1.1	Não	Não iniciado	Verificar com a gestora qual o tipo de consulta. Será por meio de um formulário/questionário?
---------------	-------	-------------------------	---------------------	----	------------	------------	--	-------	-----	--------------	---

Projeto Trilha PGE

Gestora: Eliza Martins Silva

Situação das atividades

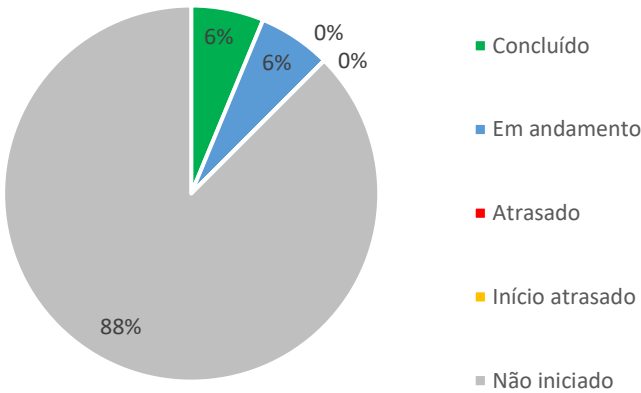

DESTAQUES


- Sem destaques

1.1.2	Elaboração do TR para consultoria externa	Eliza M. Silva	90	01/10/2025	31/12/2025		1.1.1	Sim	Em andamento		1	Conforme planejado	
-------	---	----------------	----	------------	------------	--	-------	-----	--------------	--	---	--------------------	--

Projeto PGE Acessível

Gestoras: Maria de Lourdes Abdalla Goulart Starling e Silvia

Situação das atividades

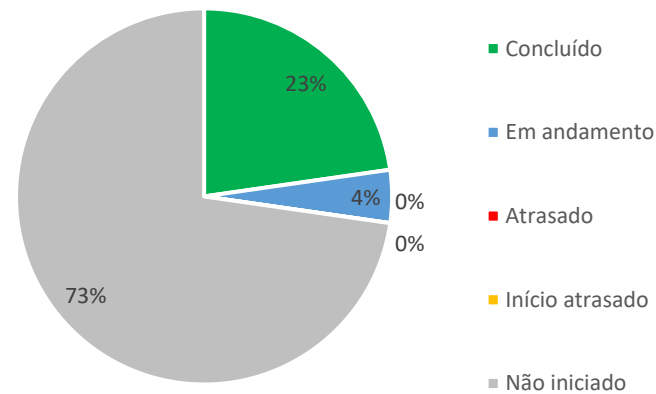


DESTAQUES

- Tarefa em risco: Pesquisa de mercado e mapa de preços (Consultoria) – Risco de não conseguir cumprir consulta ao mercado dado baixo retorno das empresas. Período com muitas férias de atores envolvidos no processo. Mitigação já iniciada: buscar outras contratações que podem servir como referência.

Projeto Conecta+Seguro

Gestor: Vitor Santos Martins

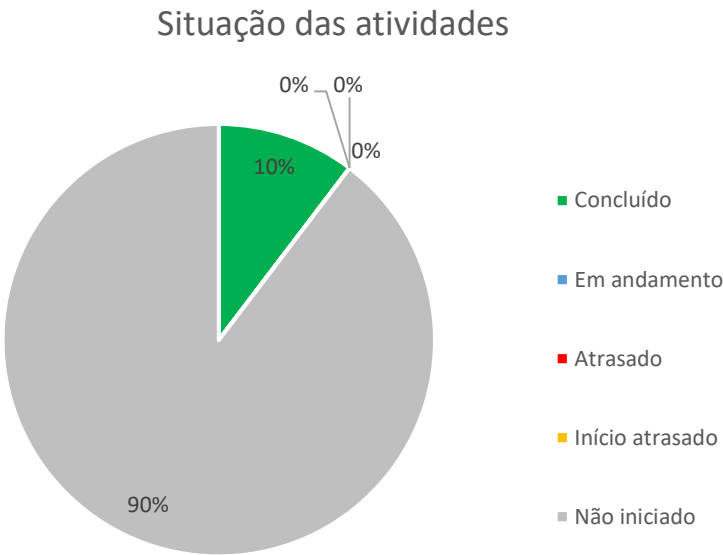


DESTAQUES

ID	Problema/Necessidade Identificada	Ação Corretiva Proposta (O que fazer?)	Responsável (Quem)	Prazo	Situação	Recursos Necessários (Como/Quanto?)
PA-1701	Conflito com outras atividades	Delegação para equipe técnica	Vitor	17/10/2025	Concluído	

Projeto PGE UP

Gestor: Vitor Santos Martins

Situação das atividades

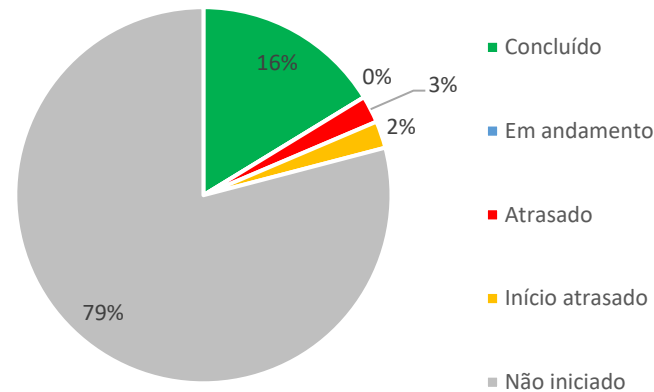

DESTAQUES


ID	Tarefa	Responsável	Duração (dias)	Data de Início	Data de Fim (planejado)	Data de fim (executado)	Predecessoras (ID)	Início Confirmado?	Situação das atividades
1.8	Elaboração do Relatório de Diagnóstico			14/10/2025	21/10/2025			Sim	Atrasado
1.9	Revisão e aprovação			22/10/2025	24/10/2025			Não	Início Atrasado

ID	Problema/Necessidade Identificada	Ação Corretiva Proposta (O que fazer?)	Responsável (Quem)	Prazo	Situação	Recursos Necessários (Como/Quanto?)
PA-1801	Revisar entregas após relatorio de diagnostico	Reunião com patrocinadora para alinhar nos prazos das demais etapas	Vitor	27/10/2025	Não iniciado	
PA-1802	Novos prazos	Realizar ajustes no cronograma e no PCA 2025/2026	Vitor	31/10/2025	Não iniciado	

Projeto Inova PGE

Gestor: Paulo Sérgio de Souza

Situação das atividades

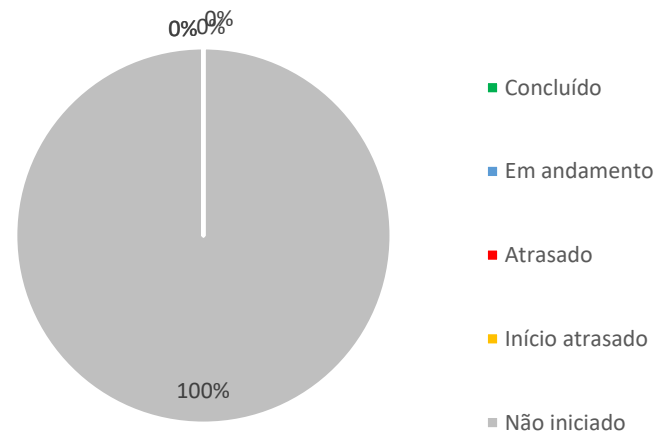


DESTAQUES

- Todas as ações tem seu início previsto para 2026

Projeto Governança em Ação

Gestor: Paulo Sérgio de Souza

Situação das atividades

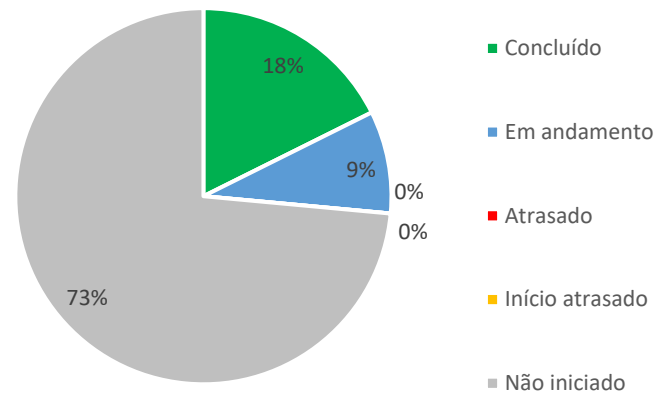

DESTAQUES

- Sem destaques. Todas as tarefas estão dentro do prazo
